



Dňa: 18-03-2016	
Číslo:	komu: SIE/RS

Zmluva o dielo č. SS/006/2016

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Sídlo:	Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, SR
V mene ktorého koná:	Ing. Emil Vozár, Mgr. Igor Rozenberg, MBA, konatelia
IČO:	31 609 651
DIČ:	2020479714
IČ DPH:	SK2020479714
Bankové spojenie:	SLSP a.s. Žiar nad Hronom
Číslo účtu:	/
IBAN:	SK
Kontaktná osoba:	Mgr. Igor Rozenberg, MBA
Telefón:	045/ 678 70 11
E-mail:	igor.rozenberg@tszh.eu
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:	SEDASPORT, s.r.o.
Sídlo:	Staromyjavská 1031/14 907 01 Myjava Slovenská republika
Zastúpený:	Pavol Švancara, konateľ
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro, vložka č.:18797/R
Bankové spojenie:	Sberbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	
IČO:	36 315 788
DIČ:	2020189556
IČ DPH:	SK2020189556
Kontaktná osoba:	Pavol Švancara, palos@sedasport.com, 0907 892 060

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet zmluvy o dielo

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi dielo špecifikované v tomto odseku. Predmetom tejto zmluvy o dielo je
 - a) príprava a likvidácia staveniska nevyhnutného na montáž a výstavbu tribún na Futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom (ďalej ako „Futbalový štadión“),
 - b) **výroba, dodávka, montáž 6 radových montovaných tribún na Futbalový štadión s kapacitou 1 666 sklopných sedadiel v zmysle ich technickej špecifikácie podľa prílohy č. 1, a 615 ks sklopných sedadiel na hlavnú tribúnu v zmysle ich technickej špecifikácie podľa prílohy č. 1,**
 - c) zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia na výstavbu tribún na Futbalovom štadióne,
 - d) zabezpečenie vypracovania statického posudku tribún pred ich výrobou a montážou na Futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom a výrobné a dielenskej dokumentácie tribún,
 - e) zabezpečenie stavebného dozoru na výstavbu tribún v zmysle stavebného zákona,
 - f) zabezpečenie všetkých zákonom vyžadovaných dokumentov potrebných k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na dielo,
 - g) stanovenie autorského dozoru nad súladom realizácie stavebných prác s projektovou dokumentáciou
 - h) poskytnutie záruky na dielo.

(ďalej len „dielo“) - a to v súlade s rozpočtom diela, Rámcovou dohodou, uzatvorenou medzi Slovenským futbalovým zväzom a Zhotoviteľom, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej ako „Rámcová dohoda“), a podľa časového harmonogramu postupu stavebných prác, a to v kvalite podľa príslušných platných technických noriem, schválených technologických postupov, a platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov. Rozpočtom diela sa rozumie výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
2. V rozsahu predmetu diela podľa ods. 1 tohto článku je aj
 - kompletne stavebné a montážne práce v zmysle prílohy č. 2 - výkaz výmer,
 - vykonanie predpísaných alebo dohodnutých skúšok a skúšobnej prevádzky,
 - odovzdanie všetkých atestov, certifikátov, revízijských správ a osvedčení podľa platných alebo dohodnutých predpisov a noriem, všetky tieto doklady je potrebné dodať vo forme tlačenej a digitálnej (CD) a množstve (min. 1 originál, pokiaľ sa v zmluve neuvádza inak) podľa požiadaviek Objednávateľa,
 - likvidácia odpadov produkovaných pri realizácii predmetu tejto zmluvy,
 - vedenie stavebného denníka,
 - zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebného charakteru k riadnemu vykonaniu diela,
3. Predmetom zmluvy o dielo nie je zabezpečenie majetkovoprávných vzťahov v rámci prípravy stavby, povoľovacieho a schvaľovacieho procesu a realizácie stavby. Majetkovoprávne vzťahy potrebné pre účely vydania jednotlivých povolení v rámci územného a stavebného konania (napr. súhlasy, zmluvy o budúcej nájomnej zmluve, nájomné zmluvy, vlastnícky vzťah k stavebnému konaniu) alebo k prístupu na stavenisko, uloženiu podzemných sietí a stavebných objektov, ktoré sú vyvolané investíciou Objednávateľa zabezpečí Objednávateľ.
4. Miesto vykonania diela: Futbalový štadión v Žiari nad Hronom, nachádzajúci sa v športovo-rekreačnej zóne na Ul. Partizánska v Žiari nad Hronom (ďalej aj ako „stavenisko“).

Článok II

Lehota trvania zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom čase plnenia diela:
 - a) odovzdanie projektovej dokumentácie tribún pre stavebné povolenie k výstavbe tribún: do 30 (tridsať) dní od podpisu zmluvy, za podmienky, že objednávatel odovzdal zhotoviteľovi všetky nevyhnutné podklady, ktoré si zhotoviteľ od objednávatela vyžiadal.
 - b) prevzatie staveniska: do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu. Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi prevzatie staveniska písomným preberacím protokolom, zapísaným v stavebnom denníku,
 - c) začiatok uskutočňovania diela (stavby): do 2 dní odo dňa prevzatia staveniska,
 - d) lehota dodania diela (stavby): do 47 dní odo dňa prevzatia staveniska. Lehota dodania diela je stanovená v súlade s predloženou ponukou Zhotoviteľa a v súlade s č. II, ods. 3 Rámcovej dohody.
2. Po začatí uskutočnenia stavby zmluvné strany vyhotovia protokol o zahájení prác, ktorého súčasťou je preberací protokol o prevzatí staveniska. Objednávateľ a Zhotoviteľ berú na vedomie a súhlasia s tým, že projektová dokumentácia, ktorú má Zhotoviteľ odovzdať v lehote určenej v tomto článku zmluvy, môže byť odovzdaná a prebratá len s predchádzajúcim písomným súhlasom Slovenského futbalového zväzu. Odovzdanie a prebratie projektovej dokumentácie bez predchádzajúceho súhlasu Slovenského futbalového zväzu je neplatné a nemá právne účinky.
3. Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť poverenému zástupcovi Objednávateľa spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu. Pokiaľ Objednávateľ neoznámí písomne svoje stanovisko do 7 dní, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania so svojim plnením, ak je omeškanie spôsobené akýmkoľvek prekážkami na strane Objednávateľa, ktoré zabraňujú Zhotoviteľovi dodržať termín realizácie diela, najmä nedodržaním termínu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi, nedostatočnou stavebnou pripravenosťou Objednávateľa alebo neposkytnutím riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa pri realizácii diela.

Článok III

Cena diela a platobné podmienky a fakturácia

1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné dokončenie celého diela zaplatiť zhotoviteľovi sumu: **750.205 EUR bez DPH (slovom: sedemstopäťdesiat tisíc dvestopäť eur)** (viď príloha č. 2 - výkaz výmer). Výkaz výmer, spracovaný Zhotoviteľom, je ocenený v súlade s Rámcovou dohodou. Cena diela ku dňu uzavretia tejto zmluvy je taká, aká bola uvedená v ponuke Zhotoviteľa ku dňu predkladania ponúk. Pre cenu diela je záväzná jednotková cena na 1 sedadlo na príslušný typ tribúny. V k tejto cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa daňových predpisov platných k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Prenos daňovej povinnosti bude uplatnený na základe § 69, ods. 12, písmeno j), zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH."
2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela v súlade so Zmluvou o spolupráci, uzatvorenou medzi Slovenským futbalovým zväzom a Objednávateľom, pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Žiari nad Hronom, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy, na základe fakturácie po dokončení alebo v priebehu nasledujúcich etáp diela, a to nasledovne:
 - a) 10 % z celkovej ceny diela + DPH po odovzdaní Objednávateľovi:
 - statického výpočtu osadenia jednotlivých tribún na základe objednávatelom predloženého geometrického plánu a geologického prieskumu, a
 - projektovej dokumentácie tribún v rozsahu nevyhnutnom pre vydanie stavebného povolenia na výstavbu tribúny, a
 - výrobnéj a dielenskej dokumentácie tribún.
 - b) 80 % z celkovej ceny diela + DPH vždy mesačne v priebehu výroby, dodania a montáže oceľovej konštrukcie tribúny, dodávky a montáže sedadiel a ďalších komponentov tribúny, a to v rozsahu podľa súpisu vykonaných prác v príslušnom mesiaci,
 - c) 10 % z celkovej ceny diela + DPH po odovzdaní diela objednávatelovi na základe podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od doručenia faktúry objednávatelovi.

bo.

4. Daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) bude uplatnená v zmysle platnej legislatívy SR (zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty).
5. Z vyfakturovanej ceny diela sa uplatňuje zádržné vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH. Zádržné sa uplatní z každej jednotlivéj čiastkovej úhrady ceny diela. Sumu zádržného vo výške 80 % sa objednávatel zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi do 30 dní po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených v kolaudačnom konaní na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa a zvyšnú časť sumy zádržného vo výške 20% do 30 dní po uplynutí 60 mesiacov odo dňa vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. Objednávatel nie je oprávnený použiť zádržné na iný účel než je odstránenie väd vyskytnutých sa na diele počas záručnej doby v prípade, ak tieto vady neodstráni zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávatela v primeranej lehote. V prípade, že zhotoviteľ riadne oznámené vady diela neodstráni v primeranej lehote, má objednávatel právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa a za účelom zaplataenia takto vzniknutých nákladov je objednávatel oprávnený použiť sumu zádržného vo výške účelne vynaložených nákladov.
6. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávatela až po uhradení ceny diela.
7. V prípade stavebnej nepripravenosti Objednávatela, pre ktorú nebude môcť Zhotoviteľ namontovať tribúny v dohodnutom termíne, sa Objednávatel zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za skutočne vyrobené tribúny a/alebo sedadlá. Zhotoviteľ vyfakturuje ku koncu každého mesiaca skutočne vyrobené tribúny a/alebo sedadlá, bez nákladov na ich montáž v súlade s výkazom výmer (príloha č. 2). Tribúny a sedadlá zostávajú uskladnené u Zhotoviteľa. Úhradou faktúry prechádza vlastnícke právo k tribúnam a/alebo sedadlám na Objednávatela.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Slovenského futbalového zväzu postúpiť alebo inak previesť svoje pohľadávky voči Objednávatelovi vzniknuté na základe tejto zmluvy alebo z nej vyplývajúce na tretiu osobu. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Slovenského futbalového zväzu zriadiť na akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávatelovi vzniknutú podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou záložné právo.

Článok IV

Podmienky realizácie diela a miesto realizácie diela

1. Zhotoviteľ uskutoční dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vo svojom mene, na svoje nebezpečenstvo a na svoje náklady v lehote podľa tejto zmluvy a zodpovedá za to, že dielo bude odovzdané Objednávatelovi riadne a včas, bez väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu diela v požadovanej kvalite a v termíne dohodnutom s Objednávatelom a písomne potvrdenom Zhotoviteľom. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 147/2013 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať školenie a zaučenie svojich pracovníkov v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ďalších právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ako i preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov.
3. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú obidve zmluvné strany (ich zamestnanci) povinné:
 - dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku,
 - dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne oboznámené,
 - nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
 - dodržiavať určený zákaz fajčenia na stavbe,
 - oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,
 - konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe.
4. Objednávatel zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie hydrogeologického prieskumu podložia tribún, prípravné stavebné práce, t.j. búracie práce, prípravu podkladu, výstavbu základov a uzemnenie tribún podľa dokumentácie dodanej Zhotoviteľom.

5. Objednávateľ vyhotoví betónové pätky tak, aby ich výškové rozdiely medzi sebou navzájom nepresahovali 30 mm, zarovná okolitý terén medzi pátkami tak, aby bol v úrovni týchto pátiiek a zhutní terén, aby sa mohla medzi pátkami pohybovať manipulačná technika. Po zhotovení betónových pátiiek vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa na ich kontrolu.
6. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady inžiniersku činnosť za účelom vydania stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia a s tým súvisiacich dokumentov (najmä vyjadrenia správcov sietí, vyjadrenia všetkých účastníkov stavebného a kolaudačného konania a pod.), ako aj generálneho projektanta zastrešujúceho projekčné práce rekonštrukcie Futbalového štadióna.
7. Objednávateľ zabezpečí stavebný dozor celej stavby, s výnimkou stavebného dozoru tribún, ktoré zabezpečuje Zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
9. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, ktorými zabráni výjazdu znečistených vozidiel na verejné komunikácie počas celej doby výstavby.
10. Zhotoviteľ zabezpečí zavedenie všetkých opatrení k obmedzeniu hlučnosti, nadmerného prachu a hromadeniu prebytočnej suty na stavenisku.
11. Spaľovanie akéhokoľvek materiálu a odpadu je na stavenisku a v jeho okolí zakázané. Zhotoviteľ je povinný triediť a likvidovať odpad v zmysle platných zákonov.
12. Prevádzkové (odberové miesta na energiu, vodu, hygiena vrátane wc), prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje Objednávateľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržba, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela a zabezpečuje ich Zhotoviteľ.
13. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady pre zhotoviteľa pri realizácii diela v mieste plnenia:
 - a) ukončenie všetkých prípravných prác na mieste realizácie diela tak, aby nemohlo vzniknúť nebezpečenstvo poškodenia diela v dôsledku takýchto prác, vyčistenie miesta realizácie, a to aj v prípade obzvlášť zložitých základových pomer v prípade potreby preložiť kolidujúce inžinierske siete a v podobných prípadoch,
 - b) uzamykateľnú miestnosť na náradie a spojovací materiál s rozmermi minimálne 2x3 m a miestnosť pre montážnikov,
 - c) strážnený priestor (betónovú plochu) na zloženie, uskladnenie a predmontáž kompletnej dodávky tovaru počas realizácie montážnych a stavebných prác,
 - d) priame napojenie na sieť elektrickej energie (napätie 220V, 380V), vrátane osvetlenia a samostatného meracieho zariadenia za účelom merania množstva odobranej elektrickej energie dodávateľom elektrickej energie.
14. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady nepretržité stráženie celého diela – stavby a to kamerovým systémom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
15. Zhotoviteľ si zabezpečí u Objednávateľa povolenie na vstup na stavenisko podľa pokynov Objednávateľa.
16. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s podmienkami a podkladmi Objednávateľa, v rozsahu realizačného projektu tribún, vypracovaného projektantom Zhotoviteľa.
17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že plne ovláda rozsah a povahu predmetu diela a že správne vyhotovil a ocenil akékoľvek práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy o dielo.
18. Objednávateľ má právo na prístup do dielní, výrobných priestorov alebo na iné pracoviská, ktoré bude Zhotoviteľ používať pri vykonávaní prác, ich príprave alebo skladovaní.
19. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.
20. Podmienkou riadneho odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
22. Dielo môže byť zhotoviteľom odovzdané a objednávatelom prevzaté aj v prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia

plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaníu) diela v súlade s jeho účelom. Tieto vady musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabudovať do stavby len také výrobky a materiály, ktoré budú zbavené práv tretích osôb.
24. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré zvolá objednávatel' podľa potreby, najmenej raz za 2 týždne.
25. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 dni vopred nahlásením stavbyvedúcemu Objednávateľovi a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady, iba ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, tieto budú na náklady Zhotoviteľa.
26. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník/ montážny denník. Záznamy v stavebnom/montážnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a samé o sebe neukladajú práva a povinnosti zmluvných strán.
27. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v prípade väd uvedených zápisom v stavebnom denníku stavebným dozorom, projektantom a štátnym stavebným dohľadom nápravu na odstránenie týchto väd.
28. Podmienkou odovzdania diela je dodržanie kontrolného a skúšobného plánu, včasné odovzdanie všetkých atestov, certifikátov a revízných správ ktoré sú potrebné a požadované minimálne slovenskými normami, zákonmi a Objednávateľom, v Objednávateľom požadovanej forme (tlačená a digitálna – CD) a množstve (min. 1 originál + 1 kópia, pokiaľ sa v zmluve neuvádza inak).
29. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 5 dní vopred, kedy bude stavba pripravená na odovzdanie a vyzvať Objednávateľa k zahájeniu preberacieho konania.
30. Objednávateľ dielo (stavbu) prevezme naraz ako celok, len ak dielo nevykazuje vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR a EÚ a tejto zmluvy, objednávatel' stavbu neprevezme.
31. Z preberacieho konania zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí diela, kde sa uvedú aj záväzky zhotoviteľa vyplývajúce pre neho z preberacieho konania. Protokol o prevzatí a odovzdaní diela podpísaný Objednávateľom a Zhotoviteľom je považovaný za dohodu o všetkých údajoch, opatreniach a termínoch v ňom uvedených s výnimkou tých bodov, u ktorých zmluvná strana výslovne vyhlási, že s nimi nesúhlasí. Keď Objednávateľ v protokole popísal vady a nedorobky alebo uviedol, ako sa vady diela prejavujú, platí, že tým požaduje bezplatné odstránenie väd a dopracovanie nedorobkov za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné.
32. K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady:
 - kompletne paré projektu so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác,
 - stavebné alebo montážne denníky,
 - certifikáty, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek Objednávateľa,
 - zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasпорty a návody na obsluhu,
 - prehlásenie o kompletnosti dodávky,
 - zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a projektovej dokumentácie,
 - manuál na užívanie a údržbu predmetu diela,
 - doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia k tribúne.
33. Všetky doklady uvedené v ods. 28 a 32 zhotoviteľ dodá v Objednávateľom požadovanej forme a množstve.
34. Ak Zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť zvoliť preberacie konanie, je oprávnený Objednávateľ vyzvať ho písomne ku zvolaniu preberacieho konania s určením lehoty, do ktorej požaduje zvoliť a uskutočniť preberacie konanie, ktorá však nemôže byť kratšia ako 5 dní od doručenia písomnej výzvy.
35. Ak napriek písomnej výzve Objednávateľa Zhotoviteľ nezvolá preberacie konanie tak, aby sa konalo v lehote stanovenej v tejto zmluve, je oprávnený tak urobiť Objednávateľ, pričom je oprávnený vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, uviesť v ňom vady zhotovovaného diela zistené pri preberacom

h.

konaní a oznámiť termín zvolania preberacieho konania písomne Zhotoviteľovi aspoň 3 dni pred dňom uskutočnenia preberacieho konania.

36. Ak Objednávateľ do 5 dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa neprevezme dielo bez uvedenia dôvodu alebo písomne neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať, považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté a odovzdané; tým nie sú dotknuté prípadné nároky Objednávateľa z vád a nedorobkov dodaného diela.
37. Účastníci sa dohodli, že vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovenom podľa tejto zmluvy sa považujú za vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela.
38. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody pred ich zabudovaním do stavby.
39. Zhotoviteľ umožní vstup na stavenisko tretím osobám – oprávneným zástupcom Objednávateľa a projektanta na základe zoznamu oprávnených osôb uvedených v stavebnom denníku.
40. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 3 dní po odovzdaní a prevzatí diela.
41. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť plnením diela tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny diela.
42. V prípade omeškania dokončenia jednotlivých častí diela podľa harmonogramu stavby, s výnimkou podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po uplynutí 30 dní od prvej neúspešnej písomnej výzvy k dokončeniu tejto etapy a zaistiť dokončenie diela sám alebo iným Zhotoviteľom.
43. Objednávateľ má nárok na náhradu takto vzniknutej škody podľa ods. 42 a je oprávnený odpočítať túto čiastku z ceny diela.
44. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním zapríčinenú alebo spôsobenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.
45. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.
46. Zhotoviteľ spracuje súpis všetkých vykonaných prác ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela a predloží ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Zhotoviteľ spracuje finančné vyčíslenie vykonaných prác a rozpracovaných dodávok a spracuje „dielčí konečný daňový doklad“. Prílohou účtovného dokladu musí byť odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok.

Článok V

Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastností dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na dielo je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, Objednávateľ písomne upozorní Zhotoviteľa na túto vadu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela bezodkladne od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 30 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde k dohode o inom termíne v závislosti od závažnosti a rozsahu reklamovanej vady, ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. Termín odstránenia vady musí zhotoviteľ bezodkladne oznámiť objednávatel'ovi a nesmie prekročiť primeranosť času na odstránenie konkrétnej vady, inak platí termín na odstránenie vady určený objednávatel'om oznámený obratom zhotoviteľovi potom, čo zhotoviteľ oznámil objednávatel'ovi neprimerane dlhý čas na odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný dodržať takto objednávatel'om určený termín na odstránenie vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu v termíne oznámenom zhotoviteľom alebo určenom objednávatel'om, objednávatel' je oprávnený odstrániť vadu

6.

sám alebo prostredníctvom tretej osoby a je oprávnený požadovať od zhotoviteľa úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s odstránením vady inou osobou ako zhotoviteľom a zhotoviteľ je povinný tieto náklady objednávateľovi uhradiť. Objednávateľ je oprávnený započítať si náklady vzniknuté podľa predchádzajúcej vety oproti zádržnému. Za prevzatie písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa sa považuje emailové odoslanie reklamácie na emailovú adresu zhotoviteľa alebo dátum podacej poštovej pečiatky pri poštovom odoslaní reklamácie.

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré sú spôsobené
 - a) neodbornou obsluhou alebo neodborným zásahom tretích osôb v priebehu záručnej doby, v rozpore s dodanými manuálmi na obsluhu a údržbu vypracovanými dodávateľmi alebo výrobcami jednotlivých častí, zariadení alebo dodávok,
 - b) nevykonávaním pravidelných servisných úkonov, pravidelných skúšok a revízií a pod. v čase poskytnutej záruky uvedených v predložených manuáloch na obsluhu a údržbu vypracovanými dodávateľmi alebo výrobcami jednotlivých častí, zariadení alebo dodávok,
 - c) akýmkoľvek zavineným poškodením, násilným poškodením, poškodením živelnou pohromou, poškodením spôsobeným neprimeraným používaním sklápacích sedadiel, zničením alebo poškodením spôsobeným nedbanlivosťou používateľa, nedostatočnou kontrolou a údržbou, poškodením spôsobeným nahradením alebo opravou inou firmou.

Článok VI

Zodpovednosť za škodu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá zo zmluvných strán pri plnení záväzkov z tejto zmluvy alebo inak v súvislosti s touto zmluvou poruší svoju povinnosť, je povinná nahradiť vzniknutú škodu druhej zmluvnej strane podľa Obchodného zákonníka.
2. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak chybného zadania, ktoré obdržala od druhej zmluvnej strany v prípade, že na nesprávnosť takého zadania druhú zmluvnú stranu písomne upozornila a druhá zmluvná strana na dodržaní zadania trvala alebo, ak túto nesprávnosť ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohla zistiť.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy.
4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať náhradu škody aj v prípade, že dôjde k porušeniu povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
5. Zhotoviteľ je povinný poskytovať plnenia podľa tejto zmluvy tak, aby v žiadnom prípade nedošlo ku škodám na zdraví alebo živote zamestnancov objednávateľa alebo ku škodám na majetku objednávateľa alebo ku škodám na prírode alebo životnom prostredí v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na zdraví, živote, majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré preukázateľne vznikli porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo ako následok porušenia, resp. neplnenia tejto zmluvy, alebo zhotovovania diela v rozpore s touto zmluvou, a to bez ohľadu na to, či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo osobami, ktoré zhotovujú dielo v mene zhotoviteľa.
6. Zmluvné strany budú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností, ak k tomu dôjde z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Za vyššiu moc sa napr. považujú aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre účely tejto zmluvy považujú dni s priemernou dennou teplotou nižšou ako -5 °C a tiež dni, počas ktorých trvajú v pracovnej dobe nepretržité zrážky minimálne 6 hodín. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky však nevylučujú práce v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. Všetky tieto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcom objednávateľa. V prípade rozporov sa použijú údaje namerané SHMÚ na meracej stanici najbližšej k stavenisku. Ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy. Termíny plnenia sa v tomto prípade predlžujú o dobu trvania vyššej moci a príslušná zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, počas tejto doby nie je v omeškaní. Zodpovednosť dotknutej zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ táto zmluvná strana nespĺnila svoju povinnosť bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe a začiatku udalosti vyššej moci. Ak doba trvania okolnosti vyššej moci presiahne deväťdesiat (90) dní a zmluvné strany sa nedohodnú na primeranej zmene tejto zmluvy, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy. Pre účinky odstúpenia platia ustanovenia čl. VII primerane.

Čl. VII

Zmluvné pokuty

1. V prípade, že Zhotoviteľ z dôvodov výlučne na jeho strane nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, Objednávateľ má právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny neuskutočnených prác za každý, aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania so svojim plnením, ak je omeškanie spôsobené akýmikoľvek prekážkami na strane Objednávateľa, ktoré zabraňujú Zhotoviteľovi dodržať termín realizácie diela, najmä nedodržaním termínu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi, nedostatočnou stavebnou pripravenosťou Objednávateľa alebo neposkytnutím riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa pri realizácii diela a pod. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý deň oneskorenia s odovzdaním projektovej dokumentácie a za každý deň oneskorenia s odstránením väd, t.j. ak reklamované vady Zhotoviteľ neodstráni do 30 dní odo dňa začatia odstraňovania väd, resp. v inom dohodnutom termíne.
2. Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania pri omeškaní Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

Čl. VIII

Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca, stavebný dozor a zástupca Objednávateľa, ako aj projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonaných prác, prípadne odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor Objednávateľa. Stavebný denník je vedený až ku dňu odstránenia poslednej závady alebo nedorobku.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený, do tretieho pracovného dňa na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
5. Všetky prípadné naviac práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomným dodatkom ku zmluve v súlade s ustanovením § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, inak nebudú uhradené.

Čl. IX

Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
 - a) objednávateľ v omeškaní s ktoroukoľvek platbou alebo jej časťou a táto platba nebude uskutočnená do tridsiatich (30) dní od doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa o tomto omeškaní, v ktorom zhotoviteľ zároveň upozorní objednávateľa na svoje právo odstúpiť od zmluvy,
 - b) objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutej súčinnosti a táto súčinnosť nebude poskytnutá ani do tridsiatich (30) dní od doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa o tomto jej neposkytnutí, v ktorom zhotoviteľ zároveň upozorní objednávateľa na svoje právo odstúpiť od zmluvy, alebo
 - c) na majetok objednávateľa vyhlásený konkurz alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok objednávateľa pre nedostatok majetku, alebo objednávateľ podá návrh na reštrukturalizáciu, alebo vstúpi do likvidácie.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
 - a) je na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo je zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa pre nedostatok majetku, alebo zhotoviteľ podá návrh na reštrukturalizáciu alebo vstúpi do likvidácie,
 - b) je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy počas obdobia dlhšieho ako tridsať (30) dní od doručenia písomného oznámenia objednávateľa o tomto omeškaní, v ktorom objednávateľ zároveň upozorní zhotoviteľa na svoje právo odstúpiť od zmluvy, alebo
 - c) zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie povinností zo strany zhotoviteľa sa považuje neposkytnutie plnenia

h.

podľa tejto zmluvy ani v lehote tridsiatich (30) dní od doručenia písomného oznámenia objednávateľa o tomto omeškaní, v ktorom objednávateľ zároveň upozorní zhotoviteľa na svoje právo odstúpiť od zmluvy.

- d) bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, nie kratšej ako 20 dní poskytnutej k tomuto účelu,
 - e) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zhotoviteľ zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
 - f) bez predchádzajúceho súhlasu Slovenského futbalového zväzu, prevedie zhotoviteľ všetky alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.
3. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že plnenia poskytnuté do dňa účinnosti odstúpenia si nevracajú, ak ich vzájomné vrátenie vylučuje povaha plnení, a vzájomne si vyrovnajú všetky záväzky vzniknuté z plnení, ktoré boli vykonané pred doručením odstúpenia druhej zmluvnej strane.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Ak je Objednávateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a je povinná zverejniť zmluvu v súlade s ustanovením § 5a citovaného zákona, spôsobom podľa tohto zákona, zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade s ustanovením § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Prílohy ZoD sú:
 - príloha č. 1 – Technické špecifikácie predmetu zákazky
 - príloha č. 2 – Výkaz výmer (položkovitý rozpočet) Zhotoviteľa na futbalový štadión v Žiari nad Hronom
 - príloha č. 3 – Rámcová dohoda medzi Slovenským futbalovým zväzom a Zhotoviteľom
 - príloha č. 4 – Zmluva o spolupráci medzi Slovenským futbalovým zväzom a objednávateľom
 - príloha č. 5 – Harmonogram prác
 - príloha č. 6 – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na futbalový štadión v Žiari nad Hronom
 - príloha č. 7 – Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka č.: 18797/R, oddiel Sro, nie starší ako tri mesiace odo dňa podpisu zmluvy
5. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia a jedno vyhotovenie obdrží Slovenský futbalový zväz.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi SR.
7. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote).
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé tej skutočnosti, že táto zmluva sa riadi a musí byť v súlade s Rámcovou dohodou medzi Slovenským futbalovým zväzom a Zhotoviteľom zo dňa 14.08.2014 a

h.

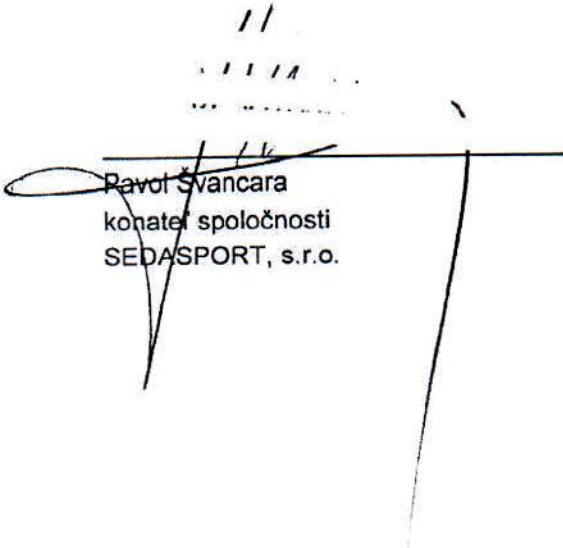
zaväzujú sa v plnom rozsahu riadiť ustanoveniami rámcovej dohody. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a rámcovej dohody má prednosť Rámcová dohoda.

9. Jednotlivé ustanovenia zmluvy o dielo sa končia vzájomným vyrovnaním záväzkov zmluvných strán.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Myjave, dňa 17.3.2016

V Žiari nad Hronom, dňa 16.3.2016

Za Zhotoviteľa:


Pavol Švancara
konateľ spoločnosti
SEDASPORT, s.r.o.

Za Objednávateľa:


Ing. Emil Vozár
konateľ spoločnosti
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.


Mgr. Igor Rozenberg, MBA
konateľ spoločnosti
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

 **Technické služby**
nad Hronom
a mesto krajčin
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Alexandra Dubčeka 4 15 58 Žiar nad Hronom

ko.

Odberateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
 Dodávateľ: SEDASPORT s.r.o., Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava

Stavba:	6radové tribúny FŠ Žiar nad Hronom, počet sedadiel 1666 a 615 sedadiel hl. tribúna				
Príloha č. 2	výkaz výmer - cenová ponuka k ZOD č. SS/006/2016				
Por.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	Celkom				750 205,02
1	Výroba - ocelová montovaná konštrukcia tribúny a schodísk, povrchová úprava žiarové zinkovanie exteriér, položka obsahuje spojovací i kotevný materiál, 1modul	modul	40,000	10 150,00	406 000,00
2	Montáž - ocelová konštrukcia tribúny a schodísk, 1modul	modul	40,000	1 382,70	55 308,00
3	Výroba - ocelové montované zábradlie, RAL xxxx-určí investor, povrchová úprava komaxit exteriér,	modul	40,000	318,61	12 744,50
4	Montáž - ocelové montované zábradlie, 1modul	modul	40,000	56,23	2 249,00
5	Dodávka - AL pochodzné podlahové profily, bez povrchovej úpravy, položka obsahuje spojovací materiál, spony, prechodové lišty a PE páska podkladová 3x60	m	3 050,000	14,87	45 353,50
6	Montáž - AL pochodzné podlahové profily	m	3 050,000	2,63	8 021,50
7	Dodávka - trapézový plech, RAL standart-určí investor, profilácia T8/94, položka obsahuje spojovací	m2	996,000	5,76	5 738,40
8	Montáž - trapézový plech	m2	996,000	4,62	4 599,50
9	Dodávka - PC doska LT2UV10/2RS, RAL standart-určí investor, položka obsahuje olepenie dutín	m2	910,000	10,69	9 727,90
10	Montáž - PC doska LT2UV10/2RS	m2	910,000	9,00	8 190,00
11	Výroba - sedadlo sklopné plastové s celoodcelovým rámom, RAL xxxx, povrchová úprava komaxit exteriér, položka obsahuje kotevný a spojovací materiál a číslovanie miest a rád	ks	2 281,000	42,50	96 942,50
12	Montáž - sedadlo sklopné plastové s celoodcelovým rámom	ks	2 281,000	7,50	17 107,50
13	D+M zálievka pätných plechov, tl.40mm, počet stĺpov 174ks	ks	147,000	10,00	1 470,00
14	Geometrické a vytyčovací práce	kompl	1	532,00	532,00
15	Štúdia a projekt pre stavebné povolenie	kompl	1	75 020,50	75 020,50
16	Zariadenie staveniska	kompl	1	1 200,00	1 200,00

Príloha C. 5:

HARMON0GRAM

Task #	Task Name	Duration	Schedule Start	Schedule Finish	Qtr1, 2016							Qtr2, 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Feb							Mar							Apr							May							Jun							Jul																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					1	8	15	22	29	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	NOVÉ TRIBÚNY ŽIAR NAD HRONOM	143d	15/02/16	31/08/16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Complete

Complete Milestone

Remaining

Remaining Milestone

Complete

Complete Milestone

Remaining

Remaining Milestone

Delay

Total Float (+)

Free Float

Remaining Milestone

Complete Milestone

Remaining

Complete Milestone

Remaining Milestone

Non-Resource

Total Float (-)

Required Date

Baseline 1

Complete

Complete Milestone

Remaining

Complete Milestone

Remaining Milestone
